




مرکز جمعیتی سلامت کياشهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کيلان

کد فرم: REP-YMO-۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۹/۴

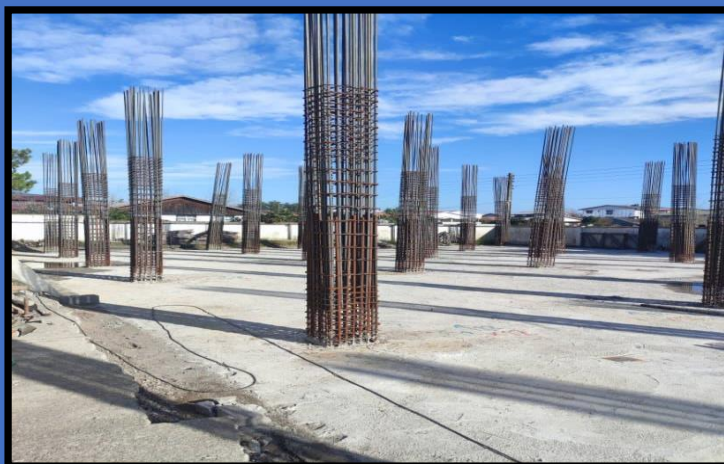

مشخصات کلی طرح

مجری	تعداد طبقات	پیشرفت فیزیکی	زیربنا (مترمربع)	سال شروع	سال پایان	مشاور	پیمانکار	پیش بینی زمان افتتاح
دانشگاه علوم پزشکی	۳ طبقه	۱۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۲	-	-	پایدارسازان پائیزان	اسفند ۱۴۰۳

مشخصات قرارداد

عنوان	مبلغ قرارداد (ریال)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد
احداث اسکلت و سربندی و پوشش سقف مجتمع سلامت کياشهر	۱۰۶,۹۹۱,۹۸۰,۶۶۴	۴۷۷۹	۱۴۰۲/۲/۱۱	

امکانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

اجرای عملیات مربوط به فونداسیون

موانع و مشکلات:

- ۱- اخذ انشعاب (آب و برق)
- ۲- نیاز به عقد قرارداد تکمیلی
- ۳- تامین منابع مالی

کل اعتبار هزینه شده جهت ساخت	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات هزینه شده	کل اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل	کل اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات مورد نیاز
۳,۴۴۰	۰	۳,۴۴۰	۲۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
